



週休2日の考え方 例示

例1 週休2日制確保工事における対象期間とは、現場着手日から工事完了日までの期間

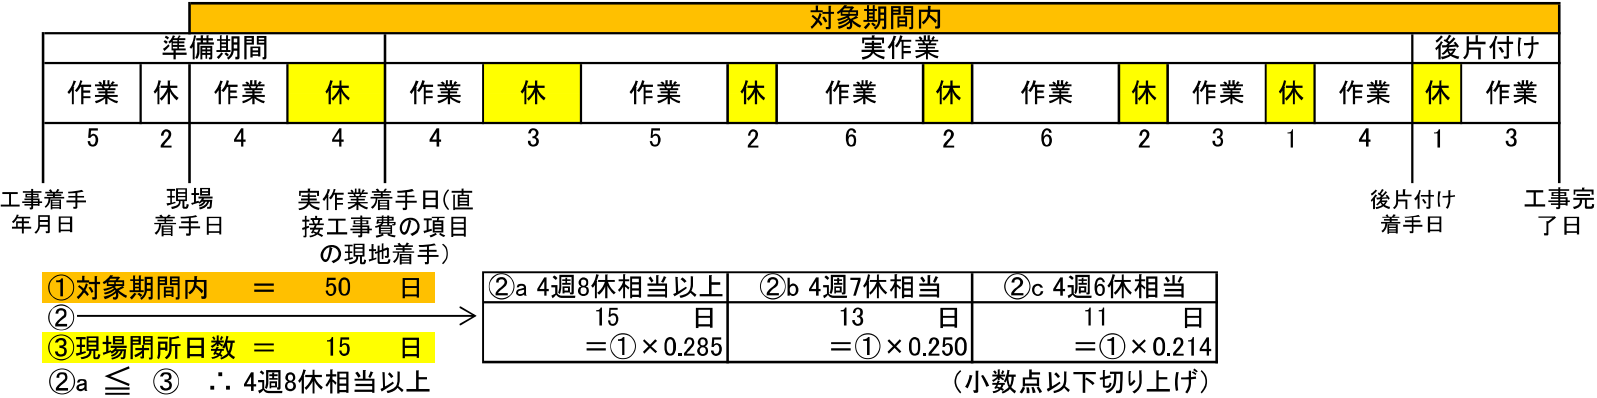

例2 年末年始6日間と夏季休暇5日間を除く

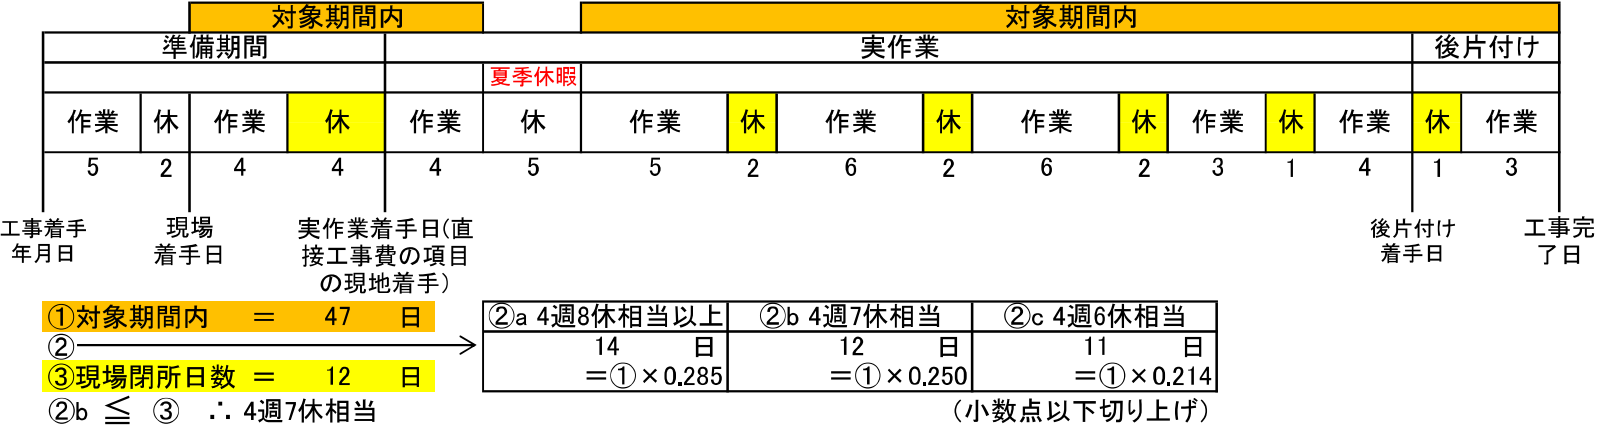

例3 工場製作期間がある場合は、対象期間内から除く

対象期間内

準備期間						実作業												後片付け			
工場製作期間						現場作業															
作業	休	作業	休	作業	休	作業	休	作業	休	作業	休	作業	休	作業	休	作業	休				
5	2	4	4	4	3	5	2	6	2	6	2	3	1	4	1	3					
工事着手 年月日		現場 着手日		実作業着手日(直 接工事費の項目 の現地着手)														後片付け 着手日		工事完 了日	

①対象期間内 = 35 日

② →

③現場閉所日数 = 8 日

②c ≤ ③ ∴ 4週6休相当

②a 4週8休相当以上	②b 4週7休相当	②c 4週6休相当
10 日	9 日	8 日
= ① × 0.285	= ① × 0.250	= ① × 0.214

(小数点以下切り上げ)

例4 全部中止期間は、対象期間内から除く

対象期間内				対象期間内															
準備期間				実作業												後片付け			
				全部中止															
作業	休	作業	休	休	作業	休	作業	休	作業	休	作業	休	作業	休	作業				
5	2	4	4	7	5	2	6	2	6	2	3	1	4	1	3				
工事着手 年月日		現場 着手日		実作業着手日(直接 工事費の項目 の現地着手)												後片付け 着手日		工事完了 日	

①対象期間内 = 43 日

②

③現場閉所日数 = 12 日

②b ≤ ③ ∴ 4週7休相当

②a 4週8休相当以上

②b 4週7休相当

②c 4週6休相当

13 日
= ① × 0.285

11 日
= ① × 0.250

10 日
= ① × 0.214

(小数点以下切り上げ)

例5 一部一時中止期間は、対象期間内から除かない

準備期間				対象期間内												後片付け					
				実作業																	
				一部一時中止																	
作業	休	作業	休	作業	休	作業	休	作業	休	作業	休	作業	休	作業	休	作業	休				
5	2	4	4	4	3	5	2	6	2	6	2	3	1	4	1	3					
工事着手 年月日		現場 着手日		実作業着手日(直 接工事費の項目 の現地着手)														後片付け 着手日		工事完 了日	

①対象期間内 = 50 日

② →

③現場閉所日数 = 15 日

②a ≤ ③ ∴ 4週8休相当以上

②a 4週8休相当以上	②b 4週7休相当	②c 4週6休相当
15 日	13 日	11 日
= ① × 0.285	= ① × 0.250	= ① × 0.214

(小数点以下切り上げ)

例6 降雨、降雪、猛暑等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含める。

対象期間内																					
準備期間				実作業												後片付け					
																雨		雪			
作業	休	作業	休	作業	休	作業	休	作業	休	作業	休	作業	休	作業	休	作業	休				
5	2	4	4	4	3	5	2	6	2	6	2	3	1	4	1	3					
工事着手年月日		現場着手日		実作業着手日(直接工事費の項目の現地着手)														後片付け着手日		工事完了日	

①対象期間内 = 50 日

②

③現場閉所日数 = 15 日

②a ≤ ③ ∴ 4週8休相当以上

②a 4週8休相当以上

15 日
= ① × 0.285

②b 4週7休相当

13 日
= ① × 0.250

②c 4週6休相当

11 日
= ① × 0.214

(小数点以下切り上げ)
